TRR / QR / AR / DR MINUTES

LIST OF MINUTES INCLUDED IN THIS SECTION:

DOCUMENT NUMBER	DATE	DESCRIPTION
RICSYS-MI-CGS-022	28/08/07	ECAL THERMOSTATS INSTALLATION

All information contained in this document are property of CARLO GAVAZZI SPACE SpA. All rights reserved.

ORIGINALE ARCHIVIO

(5)

CARLO GAVAZZI SPACE SpA	RELAZIONE DI RIUNIONE / VISITA *MINUTES OF MEETING / VISIT*	N° RICSYS-MI-CGS-022 FOGLIO *SHEET* 1 DI *OF* 2 ANNEX 1

DATA – *DATE*	LOCALITA' – *LOCATION*	COMMESSA – *JOB*	RIF. - *REF.*
28/08/07	CERN	RICH SYSTEM	1913A

Marco, IMPIANTO *PROJECT*	DESCRIZIONE *DESCRIPTION*: RICH SYSTEM: ECAL TERMOSTATS INSTALLATION	CLIENTE - *CUSTOMER*: ASI
	LOCALITA' *LOCATION*: CERN	ORDINE - *CONTRACT*: I/020/03/0
SCOPO RIUNIONE *PURPOSE OF MEETING*	• ECAL TERMOSTATS INSTALLATION • ECAL TERMOSTATS AND HEATERS WIRES CRIMPING • ECAL TERMINAL BLOCK CABLING	REDATTO – *WRITTEN BY*: P LOBASCIO
		LISTA DI DISTRIBUZIONE *DISTRIBUTION LIST*: Partecipanti + CGS L. Cremonesi CGS M. Olivier CGS M. Molina CGS C. Vettore " F. FACCHIN " G. BORGHI

PRESENTI - *ATTENDED BY*	NOMI - *NAMES*
	LOBASCIO PASQUALE
	CADOUX Franck

PUNTI *ITEMS*	ARGOMENTI DISCUSSI – DESCRIPTION OF DISCUSSION	AZIONE A CURA [1] *ACTION BY* [1]
1	All the 78 ECAL thermostats have been installed.	LOBASCIO P. 28/08/07
2	See point 3,4,5,6 for detail	
3	TH aa S/N 202 (MAIN) D/C 0631 TH ab 209 (RED) " STARBOARD	RICH SYSTEM
4	TH ba 206 (MAIN) D/C 0631 TH bb 210 (RED) " WAKE	VEDI
5	TH ca 208 (MAIN) D/C 0631 TH cb 201 (RED) " PORT	ELENCO
6	TH da 203 (MAIN) D/C 0631 TH db 215 (RED) " RAM	

10 SET. 2007

1) INDICARE IL NOMINATIVO RESPONSABILE DELL'AZIONE E DATA DI COMPLETAMENTO

Mod. N° MOM.06/02

CARLO GAVAZZI SPACE SpA	RELAZIONE DI RIUNIONE / VISITA *MINUTES OF MEETING / VISIT*	N° RICSYS-MI-CGS-022 FOGLIO *SHEET* 2 DI *OF* 2 ANNEX 1

DATA – *DATE*	LOCALITA' – *LOCATION*	COMMESSA – *JOB*	RIF. - *REF.*
28/08/07	CERN	RICH SYSTEM	1913A

PUNTI *ITEMS*	ARGOMENTI DISCUSSI – DESCRIPTION OF DISCUSSION	AZIONE A CURA [1] *ACTION BY* [1]
7	All the Termostats and Heaters wires have been crimping	Lobascio P. 04/09/07
8	All the 4 Terminal block cabling have been performed	Lobascio P. 05/09/07
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		

1) INDICARE IL NOMINATIVO RESPONSABILE DELL'AZIONE E DATA DI COMPLETAMENTO

5/9/07 CERN - AMS 02 RICSYS - MI - CGS - 022

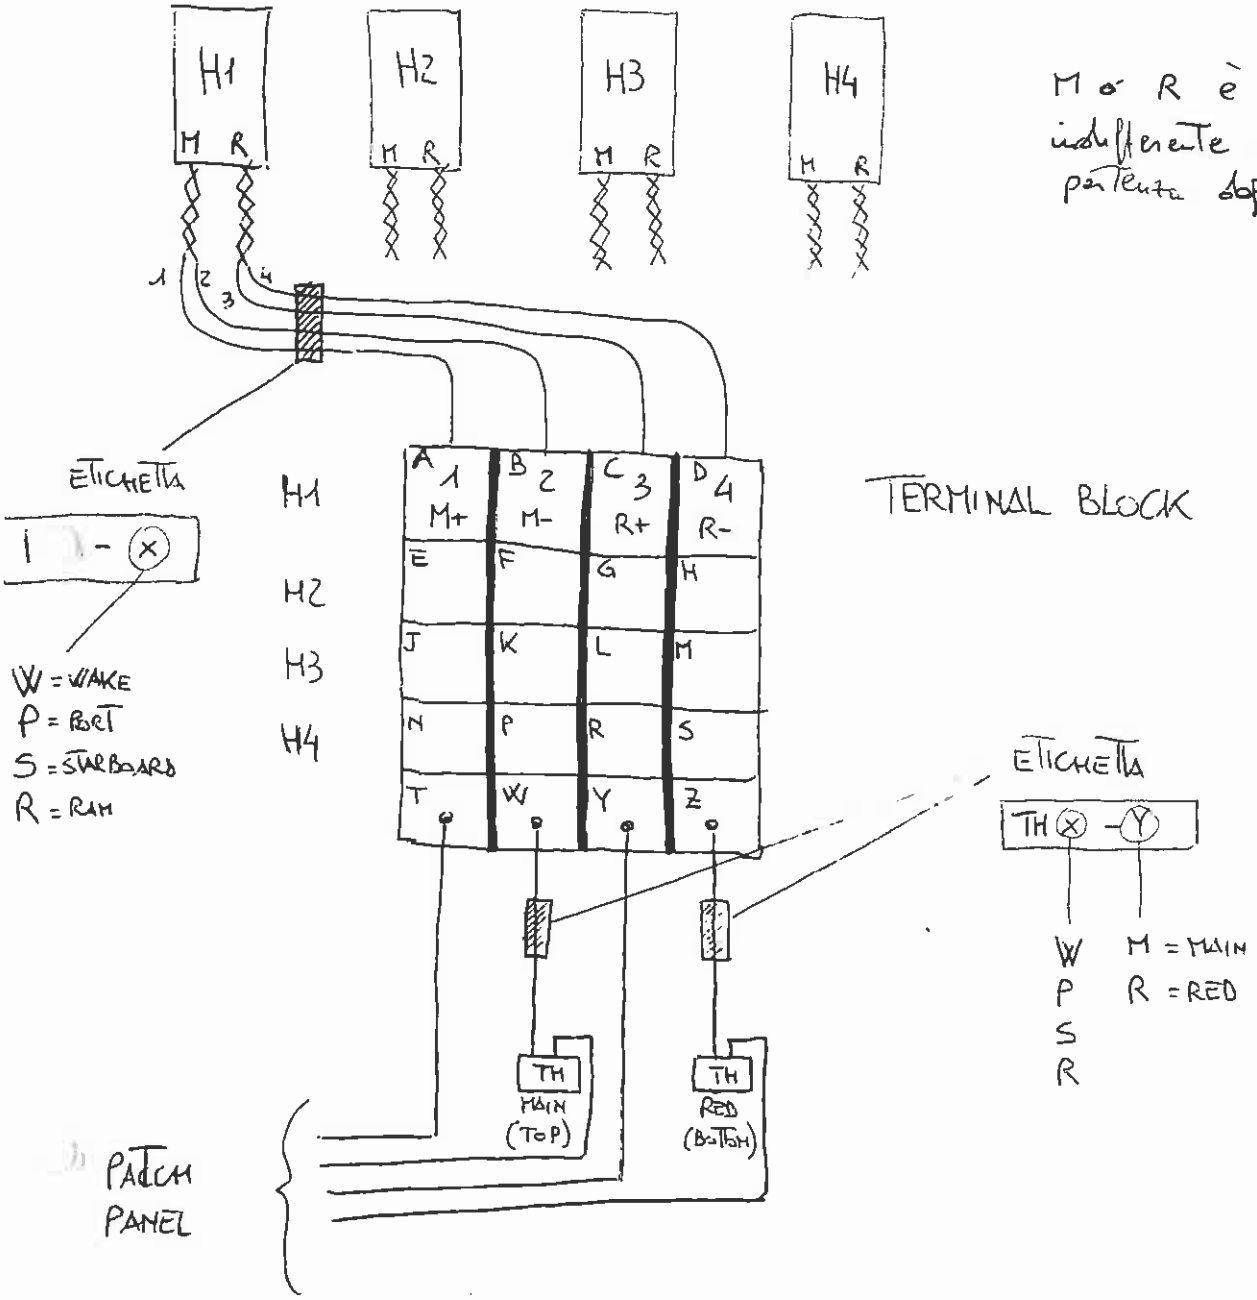

M o R è indifferente alla partenza degli Heaters!

Resistenza Heaters misurata sui punti "T-W" (MAIN) e "Y-Z" (RED.)

- STARBOARD M 721 Ω
- " R 717 Ω
- WAKE M 714 Ω
- " R 715 Ω
- PORT M 712 Ω
- " R 721 Ω
- RAM M 721 Ω
- " R 720 Ω

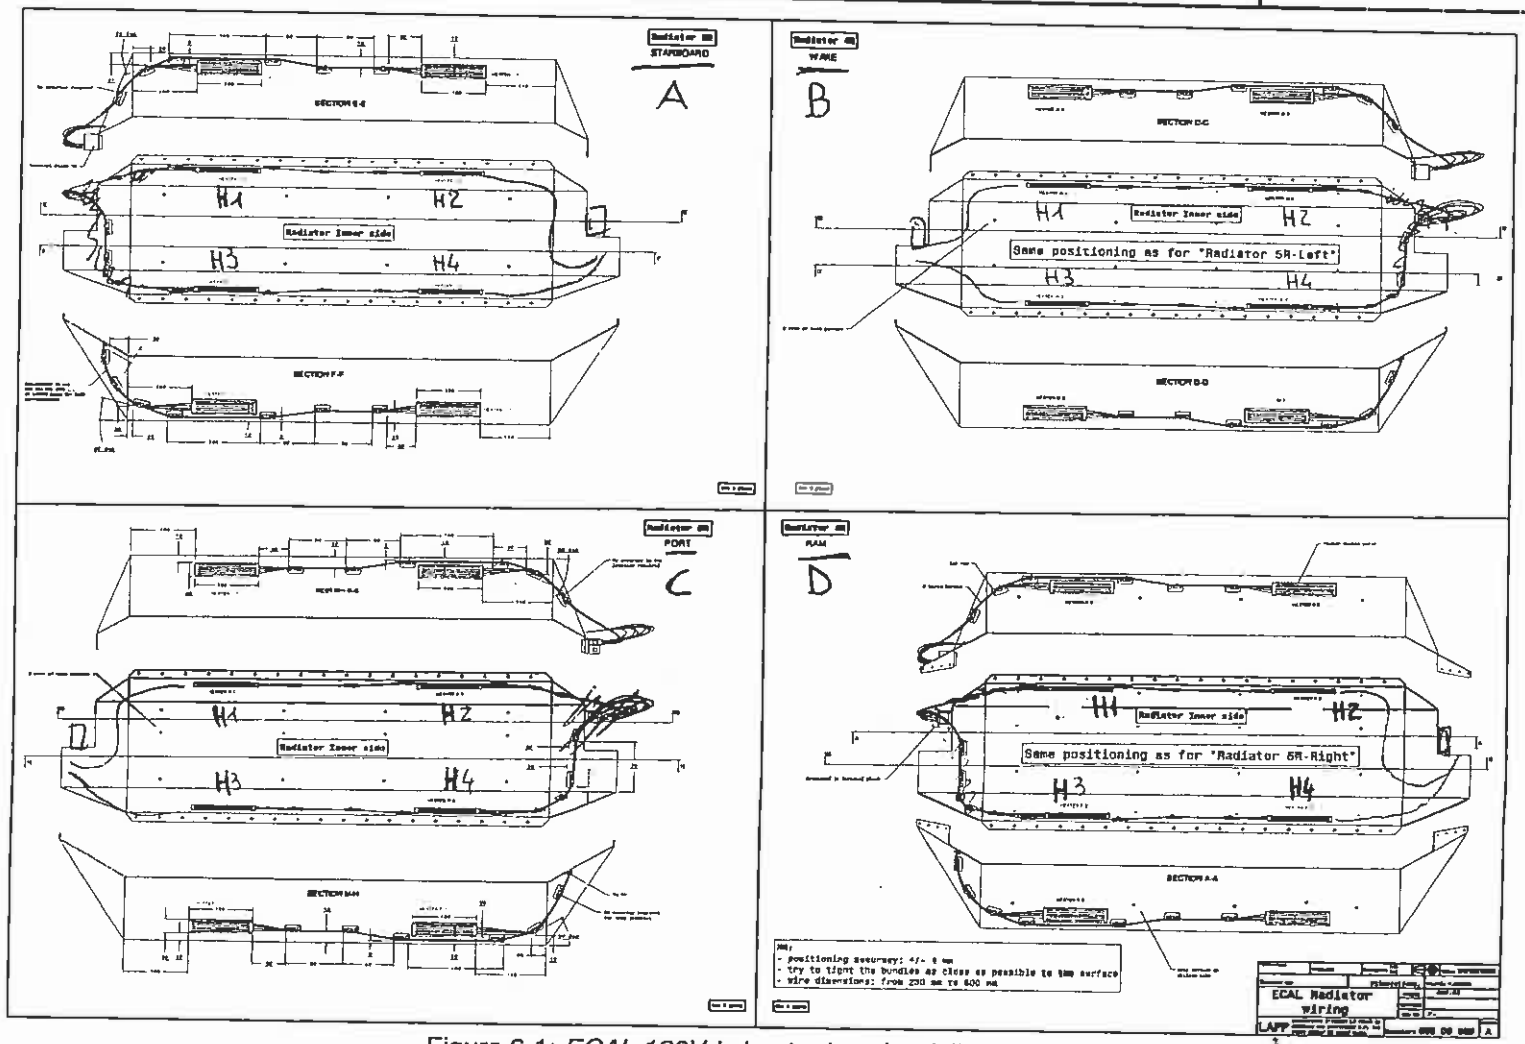

Figure 6-1: *ECAL 120Vdc heater location (all radiators)*

CADDUX

2/2

Questo documento contiene informazioni di proprietà di CARLO GAVAZZI SPACE SpA. Tutti i diritti sono riservati.
All information contained in this document are property of CARLO GAVAZZI SPACE SpA. All right reserved.
